


管理番号

P30412

通電確認チェックシート

検査日	2026年4月14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ターボ分子ポンプセット	電源・電圧	単相 100V	冷却法	空冷
型式	STP-301/SCU-301	周波数	50 / 60 Hz	到達圧力	$6.5 \times 10^{-6} \text{Pa}$
メーカー名	セイコー精機(エドワーズ)	吸気フランジ	ISO100	回転数	48000rpm
TMP Ser,No	21S99H6300	排気フランジ	NW25	排気速度 N2/H2	300L/S
コントローラーSer,NO	43495	重量	11/7Kg	軸受方式	磁気軸受

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 動作(インチング)	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。(記載事項⇒通電確認)	○

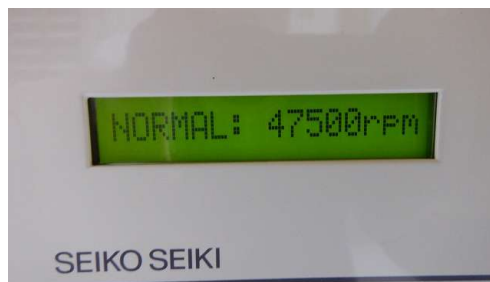

* LOCAL運転にて動作確認実施しました。

・STARTにてACC(加速)表示し正常にNOR(定常回転)に到達しました。

・STOPにてDEC(減速)表示し正常にSTOP(停止)しました。

取扱説明書(無) * 別紙にて加速/減速時の写真を添付しております。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

