


動作確認チェックシート

検査日	2025年11月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200V	排気速度	10,000L/min
型式	BEH-600#2	周波数	50・60 Hz	外寸	385×975×885
メーカー名	大晃機械工業	吸気口	NW50	重量	350Kg
機械Ser.No	RCB9203	排気口	NW40		
製造年月	2023年	到達圧力(規格値)	0.13Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・起動困難・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	×
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	×
6 確認シール	動作確認シールを貼る。	○



* 排気サイレンサーは
付属しません。

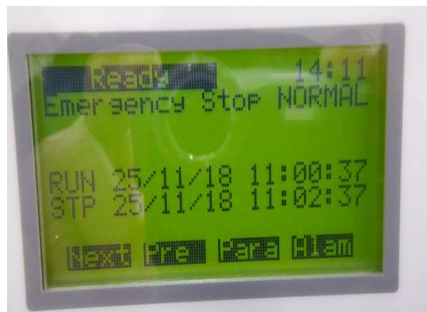

* MFC不良により起動後、アラーム発報により停止⇒MFC交換が必要。

* MFC

* 暖気運転90分後、再起動⇒60秒経過後の到達圧力です。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント) ジャンク品取りて販売検討

[責任者]

動作(NG) 作業時間[2.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

