

## 動作確認チェックシート

|          |              |                  |          |        |                  |
|----------|--------------|------------------|----------|--------|------------------|
| 検査日      | 2026年 6月 30日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |          |        |                  |
| 商品名      | 電気炉          | 電源電圧             | 3相 200V  | 最高使用温度 | 1250℃            |
| 型式       | KBF668N1     | 周波数              | 50/60 Hz | 寸法     | W865 D1070 H1620 |
| メーカー名    | 光洋サーモシステム    | 容量               | 10.5kW   | 庫内寸法   | W310 D690 H300   |
| 機械Ser.No | 102404A      |                  |          |        |                  |
| 製造年月     | 年 月          |                  |          |        |                  |

| チェック項目      | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-------------|----------------------------------------|----------|
| 1 外観        | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。   | ○        |
| 2 起動動作      | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3 SW設定      | SWの機能は正常か。                             | ○        |
| 4 保管・出荷準備   | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 5 確認シール     | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |
| 6 データバックアップ | PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)   |          |

## 備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境 室温:26.0℃、湿度:52.2%RH


## ■ 外観 … 異常なし



## ■ 最高使用温度 到達と時間の確認



社内測定器:YOKOGAWA DX220-1-1

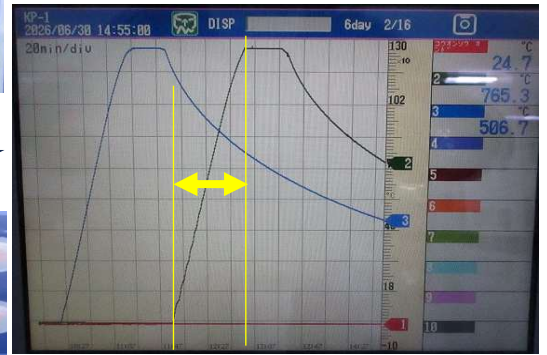

※ 28℃から1250℃へ63分で到達。30分保持後降温

## ■ 通電確認 … エラー等の発報なし

立ち上がり初期状態の確認 … OK



※リセット状態表示

## ■ 過熱防止計(過昇温アラーム)動作確認



過熱防止計が作動するとLEDが点灯して電気炉ヒーターへの電源が遮断されることを確認…OK

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[ 5h ]

検査担当者[ Kugizaki ]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

穂苅
