

WD5F57

動作確認チェックシート

検査日	2017年 5月 26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	超音波小型液体流量計	電源電圧	DC12～30V/2.5VA	センサ	SLT-12
製造年月	不明	型名	SLF-100	適応配管PFA	3/4,1/2,3/8インチ
メーカー名	(株)ソニック	周囲温度範囲	-10～50℃	測定範囲	0.1～120L/分
本体寸法	95mm×48mm×130mm	測定単位	流量/積算流量	センサー質量	約450g

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	※○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1、外観パーツ確認。→問題なし。

2、簡易水流治具に取付けて流量測定確認。→測定は可能。




(※但し、取説が無いので、詳細な測定方法は不明の状態での測定。)

注意: センサーを配管径に合せ、しっかり未着固定しないと測定できない。

3、その他の機能は未確認。

動作確認

本体 PRD No.12042183

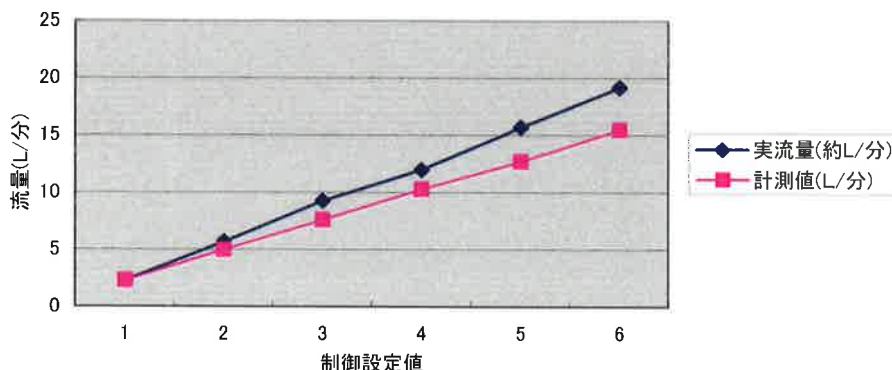

制御設定(HZ)	10	20	30	40	50	60
実流量(約L/分)	2.3	5.7	9.3	12	15.7	19.2
計測値(L/分)	2.3	5	7.6	10.3	12.7	15.5

取扱説明書(有・無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業員

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK・NG)

作業工数[3 H]

検査担当者[

小林(克)

※但し、測定器としての、精度は未確認。

ユーザー名[

]出荷日 年 月 日

