管理番号

LA0358

# 動作確認チェックシート

| 検査日 | 2025年 9月 9日 | （機械の仕様・規格を記入する。） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | サーマルサイクラー | 電源電圧 | 単相100～240V | 温度設定 | 10～100℃ |
| 型式 | Alpha AC296 | 周波数 | 50/60Hz | | |
| メーカー名 | Cole-Parmer | 大きさ(W×D×H) | 510×450×330mm | | |
| 機械Ser.No | 20092-1 | サンプル数 | 0.2mL×96<br>×2ブロック | | |
| 製造年月 | 2018年7月 | | | | |

| | チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|---|---|---|---|
| 1 | 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 | 起動動作 | POWER　ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 | SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 | 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 | 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |
| 6 | データバックアップ | PLC ( 未対象 )　　TP ( 未対象 )　　BT交換 ( 未対象 ) | |

備考(動作確認内容・不具合内容等)　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 55.0℃⇒72.0℃⇒95.0℃でのプログラムを作成し実行。左右ブロック共に問題なく終了。


2 95.0℃のプログラム実行時、プレートの温度を熱電対で測定。ブロックのフタを開けた状態で94.7℃。問題ないと考える。






左右各々 8×12＝96well

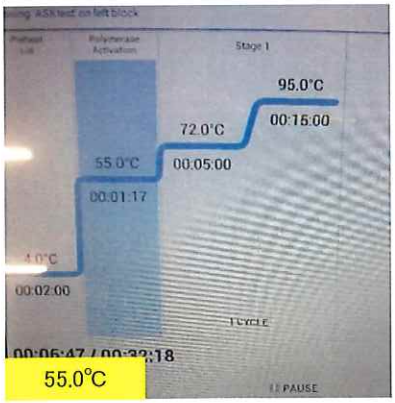


55.0℃

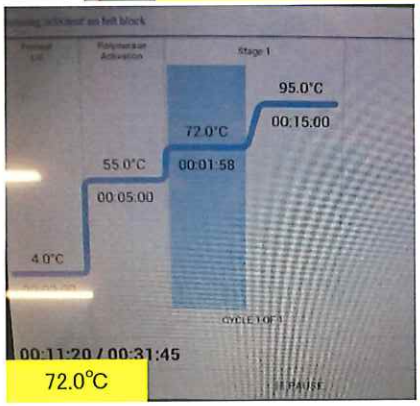

72.0℃

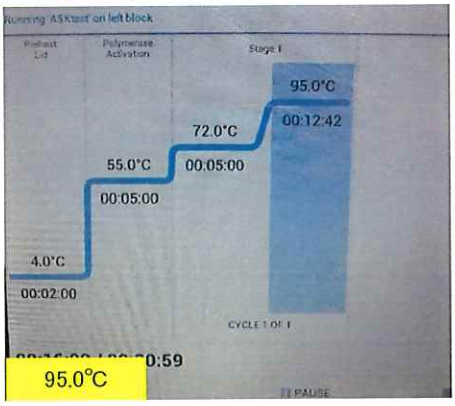

95.0℃

取扱説明書( 無 )

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

File　Maker入力
動作( OK )　　作業工数[ 2.5H]
検査担当者[ 野沢 ]

(備考欄コメント)
未使用品です。

[責任者]
