管理番号

NF1UA3

動作確認チェックシート

検査日	2017年　11月　30日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	攪拌ユニット	電源電圧	単相100～240V，　15W	速度設定	1～70rpm
型式	RMU－02	周波数	50　・　60　Hz兼用	シリンジタイプ	5～70mℓ用
メーカー名	武蔵エンジニアリング㈱	外形寸法	160×195×98mm	コントローラ／攪拌ブロック質量	1.8/0.87kg
コントローラSer,No	1110001	特注攪拌羽根	2本付属	攪拌ブロック型式	MB-70E-02

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1、外観確認。　→　問題なしOK。

2、外部/内部制御動作確認。　→動作OK。（社内治具にて入出力確認。

（コントローラ用コネクタに入力：スイッチ、出力：ブザー回路接続して入出力確認。）（出力はE3エラー発生時）


内部スイッチNO時、外部入力ONでエラー発生。

3、回転制御動作及びエアーライン確認。　→動作OK。

動 作 確 認





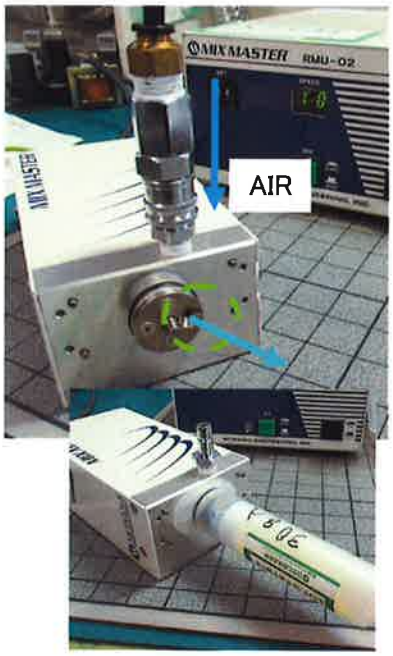

攪拌コントローラ回転速度確認		
設定	表示	実測（rpm）
10	10	10
20	20	20
30	30	30
40	40	40
50	50	50
60	60	60
70	70	70
71	E3エラー	

取扱説明書（有・(無)）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力
動作(OK・NG)　　作業工数[　3H]
検査担当者[　　小林克　　]
ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

（備考欄コメント）

[責任者]

穂苅
