管理番号

P30747

動作確認チェックシート


検査日	2025年6月2日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	クリーンブース	電源電圧	1相 100V	HEPAフィルター	3502-62N3PFFAA
型式		周波数	50/60HZ	外寸	W2020 D2000 H2240
メーカー名		FFU	NFS-10AH	内寸	W1950 D1960 H2200
機械Ser,No		風量切替	2段	換気回数	36回
製造年月		風量	2.59/4.53㎥/min		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データバックアップ	PLC（未対象）　　TP（未対象）	

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境

当社測定治具を使用し当社クリーンルーム内にて計測

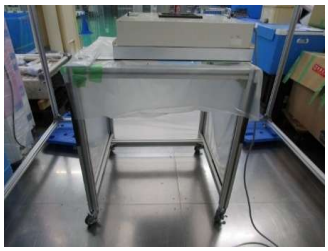

洗浄度測定　吹出面５０ｍｍ下位置にて中心部を測定





Size	Counts
0.3 μm	0
0.5 μm	0

風速測定　吹出面５０ｍｍ下位置にて中心部を測定

弱



0.12m/s

強



0.21m/s

風量（参考値）

吹き出し面 600x600mm

弱　0.6x0.6x0.12x60＝ **2.59㎥/min**

強　0.6x0.6x0.21x60＝ **4.53㎥/min**

取扱説明書（　無し　）

クリーン度：クラス10,000

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（ OK ）　　作業工数 ［ 3H ］　　カーテン・天井パネルは付属しません

検査担当者［　林　］

ユーザー名【　　】　　出荷日　　年　　月　　日
