管理番号

P30961

動作確認チェックシート


検査日	2025年　7月　4日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	チラー(空冷)	電源電圧	1相100V 50/60Hz	冷媒	R134a
型式	RTE-7	温度設定範囲	−25～150℃	バス容量	7L
メーカー名	Thermo NESLAB	最大流量(60Hz)	15L/min	バスサイズ	W168D183H152
機械Ser,No	105122067	冷却能力	500W	外寸	W325D620H600
製造年月	年　月	ヒーター容量	800w	重量	29 Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境(室温25℃　湿度59%RH)

・外観　…異常無し

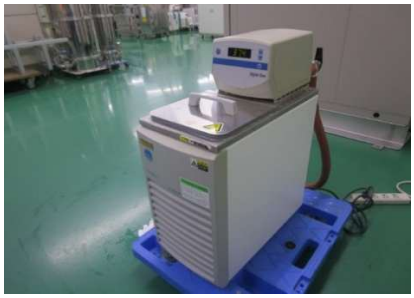

・電源投入

画面表示　確認

各設定SW操作　確認



・フロートSw

バス容量基準値内で稼働開始確認

(バス容量不足ではLow表示)

・加熱動作　(使用冷媒:水道水)

バス内温度34.1℃から設定温度(90℃)上昇まで　**約50分**

加熱ランプ　点灯確認



加熱ランプ



開始時



約50分後

・冷却動作　(使用冷媒:ショウブラインブルー)

バス内温度22.6℃から設定温度(−25.0℃)冷却まで　**約180分**

冷却ランプ　点灯確認



冷却ランプ



開始時



約180分後

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　(備考欄コメント)　[責任者]

動作(OK)　作業工数[4h]

検査担当者[　Tokunaga　]

ユーザー名【　】　出荷日　年　月　日
