
管理番号

Q40934

動作確認チェックシート

検査日	2026年6月2日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	スクロールポンプ	電源・電圧	3相　200-460V	電流値	2.8/1.3A
型式	DSR-500	周波数	50 ・ 60 Hz	排気速度	500・600L/min
メーカー名	ULVAC	吸気フランジ	NW40	モーター出力	0.6KW
機械Ser,No	OK3010104	排気フランジ	NW25	重量	44Kg
製造年月	ー	規格値（到達圧力）	1.0Pa		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	※1○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

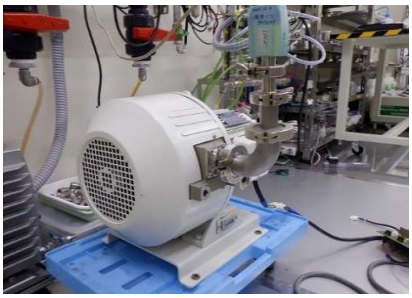







※1　到達圧力：3.1 Pa　　電流値：1.98A

・暖気運転60分後、再起動 ➡ 60秒経過後の測定圧力です。

取扱説明書（ 無 ）　　＊ 3相200V仕様にて動作確認実施しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（ OK ）　　作業工数[3.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【　　】出荷日
