管理番号

Q51038

通電（動作）確認チェックシート


検査日	2026 年5月15日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	酸素分析計	電源電圧	1相　100V	寸法	W390 D290 H215
型式	SH-ⅢD	電源周波数	50/60 Hz	重量	9.8kg
メーカー名	NGK	測定範囲	0 – 1000ppm, 0 – 10% O2	出力	4 – 20mA, 0 – 10V
機械Ser,No	9908127				
製造年月	年　月	応答時間	10-30sec	接続口径	Rc 1/4

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	通電のみ
3	SW設定	SWの機能は正常か。	–
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	–
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	–


備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

通電を行いモーター式エアポンプが動作し表面パネルのフローメーターが動作するか確認する。

→ 異常はなかった。

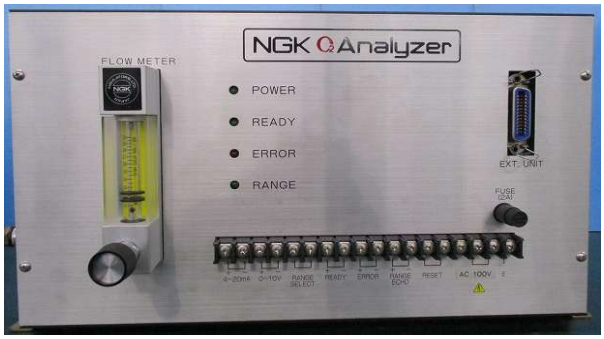

表面パネル

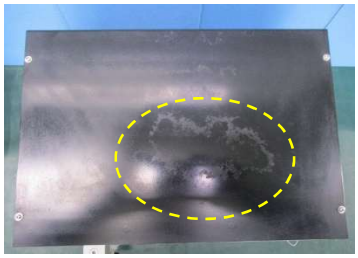

※上天面に液シミ汚れ有







【確認詳細】

①

電源OFF状態

②

電源投入と同時にモーター式

エアポンプ稼働開始

POWER LED 点灯確認OK

エラー発生無

③

フローメーター動作確認OK

流量調整可動ツマミ確認OK

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　　作業工数[　1.5H　]

検査担当者[　Kugizaki　]

ユーザー名【　　】　　出荷日　　年　　月　　日
